



**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π.
«ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ»
2007-2013**

**ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων, Μονάδα Διαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013**

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.....	4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.....	5
1.1 Ολοκλήρωση και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος.....	5
1.2 Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο .	28
1.3 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	28
1.4 Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα	31
1.5 Ρυθμίσεις παρακολούθησης.....	33
1.5.1 Κανονιστικά θέματα	33
1.5.2 1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης	34
1.5.3 Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος.....	34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ	36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ..	37
3.1 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας»	38
3.1.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	38
3.1.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	41
3.2 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου»	41
3.2.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	41
3.2.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	44

3.3 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων»	44
3.3.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	44
3.3.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	46
3.4 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας»	46
3.4.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	46
3.4.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	48
3.5 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 5: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου»	48
3.5.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	48
3.5.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	50
3.6 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 6: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων»	50
3.6.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	50
3.6.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	52
3.7 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας»	52
3.7.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	52
3.7.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	55
3.8 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου»	55
3.8.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	55

3.8.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	58
3.9	Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 9: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων»	58
3.9.1	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	58
3.9.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	61
3.10	Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 10: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»	61
3.10.1	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	61
3.10.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους	61
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΛΟΙΠΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ		61
4.1	Ενσωμάτωση της Αρχής της Μη Διάκρισης και των κριτηρίων προσβασιμότητας των Ατόμων Με Αναπηρία (Άρθρο 16/1083/2006	61
4.2	Τεχνική Βοήθεια	63
4.3	Πληροφόρηση και Δημοσιότητα	63

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2008

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Σχετικός στόχος: Στόχος «Σύγκλιση»
	Σχετική επιλέξιμη περιοχή : Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας (GR 23), Πελοποννήσου (GR 25) και Ιονίων Νήσων (GR 22)
	Περίοδος προγραμματισμού : 2007-2013
	Αριθμός προγράμματος (αριθ. CCI) : CCI 2007GR161PO007
	Τίτλος προγράμματος : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Έτος υποβολής στοιχείων : 2008
	Ημερομηνία έγκρισης της ετήσιας έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης:

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την δεύτερη ετήσια έκθεση εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, σύμφωνα με το Άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 1260/1999».

Η έκθεση συντάχθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVIII του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», καθώς και σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ' αριθ. πρωτ. 23288/ΕΥΣΣΑΑΠ/1332/23-5-08 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.1 Ολοκλήρωση και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος

. Ως δεύτερο έτος εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το 2008 ήταν έτος ολοκλήρωσης της προετοιμασίας εξειδίκευσης και ενεργοποίησης του Προγράμματος. Επίσης, πραγματοποιήθηκε η εκχώρηση στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές (ΕΔΑ) και στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) προϋπολογισμών για δράσεις που αφορούσαν τους δέκα Άξονες Προτεραιότητας. Επιπλέον, στο έτος αναφοράς πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες ενέργειες δημοσιοποίησης του Προγράμματος, και προωθήθηκε η διαδικασία των προσκλήσεων.

1.1.1 Φυσική πρόοδος του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το 2008, ήταν αφενός έτος ολοκλήρωσης της προετοιμασίας εξειδίκευσης και αφετέρου έτος ενεργοποίησης του Προγράμματος. Κατά το έτος αναφοράς πραγματοποιήθηκαν εξειδικεύσεις ορισμένων Θεματικών Προτεραιοτήτων των Αξόνων Προτεραιότητας, εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες διαχείρισης στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, έγιναν ενέργειες δημοσιοποίησης του Προγράμματος, εκδόθηκαν οι σχετικές Προσκλήσεις και πραγματοποιήθηκε η ένταξη ενός έργου στην Θεματική Προτεραιότητα 69 «Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονιστεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτημένων προσώπων» του Άξονα Προτεραιότητας 9, συνολικής Κοινοτικής Χρηματοδότησης € 6.399.661.

Συγκεντρωτικά, πέρα από την ένταξη του έργου που προαναφέρθηκε, το έτος 2008 πραγματοποιήθηκαν οι κατωτέρω ενέργειες στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων.

Εξειδικεύθηκαν οι Θεματικές Προτεραιότητες:

- 22 «Εθνικές Οδοί» και 23 «Περιφερειακές Οδοί», στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3.
- 02 «Υποδομή και τεχνολογικής ανάπτυξης (συμπεριλαμβάνοντας υλικό εξοπλισμό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών) και κέντρα αναγνωρισμένου κύρους σε εξειδικευμένη τεχνολογία», στον Άξονα Προτεραιότητας 4.
- 45 «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)», 75 «Υποδομές Εκπαίδευσης», 76 «Υποδομές Υγείας» και 79 «Κοινωνικές Υποδομές» στον Άξονα Προτεραιότητας 7.
- 44 «Διαχείριση οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων» και 46 «Αποχέτευση Ύδατος (λύματα)», στον Άξονα Προτεραιότητας 8.
- 59 «Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών» στον Άξονα Προτεραιότητας 9 και.
- 69 «Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονιστεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9.

Αφού ολοκληρώθηκαν οι ανωτέρω εξειδικεύσεις, εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες διαχείρισης στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές για συγκεκριμένες κατηγορίες Θεματικής Προτεραιότητας, συνολικού προϋπολογισμού € 145.620.950,80 και προωθήθηκε η διαδικασία για τη δημοσίευση πέντε προσκλήσεων.

Η αναλυτική παρουσίαση της Υλοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας, γίνεται στο Κεφάλαιο 3 της Παρούσας Έκθεσης.

Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΟΡΜΟΥ (CORE INDICATORS)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη											
Αριθμός Έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										30
	Αφετηρία	19									
Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										166
	Αφετηρία	360									
Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										40
	Αφετηρία	100									
Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)	Ολοκλήρωση										180
	Στόχος										
	Αφετηρία	400									
Επαγόμενες Επενδύσεις (€ million)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										42
	Αφετηρία	99									
Κοινωνία της Πληροφορίας											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										0
	Αφετηρία	77									

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Μεταφορές											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										20
	Αφετηρία	83									
Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Χιλιόμετρα κατασκευασμένων/ αναβαθμισμένων δρόμων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										149.5
	Αφετηρία	203									
Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										4
	Αφετηρία	32									
Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
(MW)	Αφετηρία	-									
Ετήσια Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις (Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Περιβάλλον											
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										40.000
	Αφετηρία	42.000									
Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										12.000
	Αφετηρία	47.000									
Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										4
	Αφετηρία	19									
Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										60
	Αφετηρία	43									
Πρόληψη κινδύνων											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										5
	Αφετηρία	54									
Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία και άλλα μέτρα προστασίας δασών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										730.238
	Αφετηρία	730.238									
Τουρισμός											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										45
	Αφετηρία	79									

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκπαίδευση											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										50
	Αφετηρία	147									
Αριθμός ωφελούμενων μαθητών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										6.750
	Αφετηρία	21.000									
Υγεία											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										50
	Αφετηρία	39									
Αστική ανάπτυξη											
Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση											
Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	23									
Ανταγωνιστικότητα											
Αριθμός έργων που αποσκοπούν στην προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και νέων τεχνολογιών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	2									
Κοινωνική Ενσωμάτωση											
Αριθμός έργων/ υπηρεσιών για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούντες ομάδες και νέους	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	7									

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη											
Αριθμός Έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										260
	Αφετηρία	460									
Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										30
	Αφετηρία	63									
Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										70
	Αφετηρία	147									
Επαγόμενες Επενδύσεις (€ million)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										70,0
	Αφετηρία	106,2									
Κοινωνία της Πληροφορίας											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										6
	Αφετηρία	9									
Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										25.570
	Αφετηρία	-									
Μεταφορές											

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										15
	Αφετηρία	39									
Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	8,5									
Χιλιόμετρα κατασκευασμένων/ αναβαθμισμένων δρόμων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										80
	Αφετηρία	138,5									
Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόμων εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση										-
	Στόχος										
	Αφετηρία	-									
Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	88									
Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (MW)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Ετήσια Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις (Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Περιβάλλον											
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										30.000
	Αφετηρία	40.000									
Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										15.000
	Αφετηρία	89.320									
Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										5
	Αφετηρία	1									
Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	2									
Πρόληψη κινδύνων											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										5
	Αφετηρία	25									
Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία και άλλα μέτρα προστασίας δασών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	638.942									
Τουρισμός											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										100
	Αφετηρία	200									
Εκπαίδευση											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										30
	Αφετηρία	24									

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Αριθμός ωφελούμενων μαθητών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										8.000
	Αφετηρία	4.500									
Υγεία											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										35
	Αφετηρία	4									
Αστική ανάπτυξη											
Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση											
Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	26									
Ανταγωνιστικότητα											
Αριθμός έργων που αποσκοπούν στην προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και νέων τεχνολογιών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	7									
Κοινωνική Ενσωμάτωση											
Αριθμός έργων/ υπηρεσιών για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούντες ομάδες και νέους	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	5									

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη											
Αριθμός Έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Αριθμός Έργων συνεργασίας επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										290
	Αφετηρία	619									
Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										20
	Αφετηρία	40									
Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										350
	Αφετηρία	739									
Επαγόμενες Επενδύσεις (€ million)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										50
	Αφετηρία	94									
Κοινωνία της Πληροφορίας											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
	Στόχος										10
	Αφετηρία	6									
Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Μεταφορές											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										53
	Αφετηρία	85									
Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Χιλιόμετρα κατασκευασμένων/ αναβαθμισμένων δρόμων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										63
	Αφετηρία	602.08									
Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόμων εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας											



Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (MW)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Ετήσια Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις (Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										-
	Αφετηρία	-									
Περιβάλλον											
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										10.000
	Αφετηρία	17.735									
Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										7.800
	Αφετηρία	9.935									
Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										2
	Αφετηρία	1									
Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										10
	Αφετηρία	0									
Πρόληψη κινδύνων											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										6



Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
	Αφετηρία	15									
Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία και άλλα μέτρα προστασίας δασών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										213.000
	Αφετηρία	213.000									
Τουρισμός											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										292
	Αφετηρία	(7 έργα + 152 ΜΜΕ 159)									
Εκπαίδευση											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										80
	Αφετηρία	92									
Αριθμός ωφελούμενων μαθητών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										10.700
	Αφετηρία	13.400									
Υγεία											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										11
	Αφετηρία	24									
Αστική ανάπτυξη											
Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση											
Αριθμός έργων για την εξασφάλιση	Ολοκλήρωση										

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων	Στόχος										
	Αφετηρία	6									
Ανταγωνιστικότητα											
Αριθμός έργων που αποσκοπούν στην προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και νέων τεχνολογιών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	13									
Κοινωνική Ενσωμάτωση											
Αριθμός έργων/ υπηρεσιών για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούντες ομάδες και νέους	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	13									

1.1.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013 ανέρχεται σε 1.442.186.000 €, εκ των οποίων 1.315.000.000 € Συνολική Δημόσια Δαπάνη, στοχεύοντας να προσελκύσει άμεσα 127.186.000 € ιδιωτικών πόρων, ήτοι 9% του συνολικού κόστους του Προγράμματος. Η Κοινοτική Συνδρομή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 914.000.000 €. Πιο παραστατικά, τα προγραμματικά χρηματοοικονομικά στοιχεία του Προγράμματος, στο σύνολό του και ανά Άξονα Προτεραιότητας, παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράμματα.

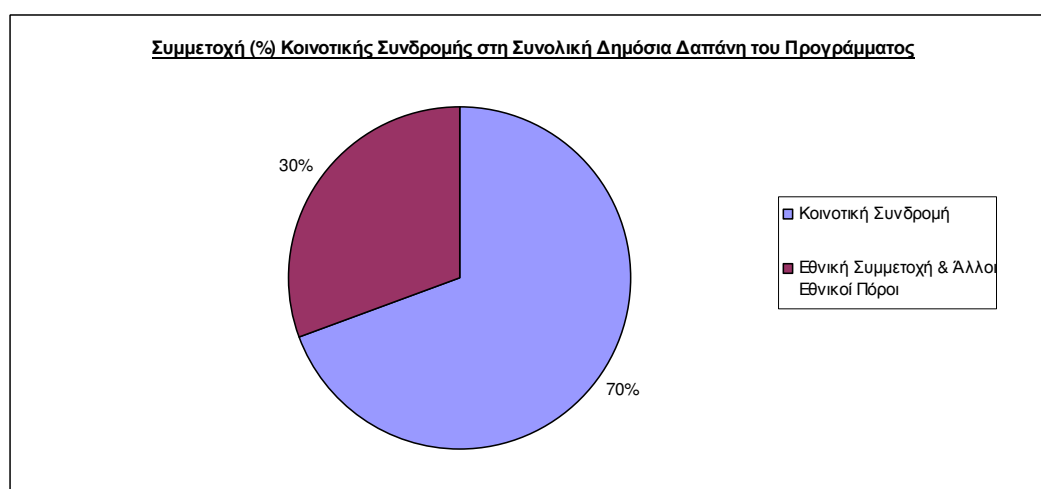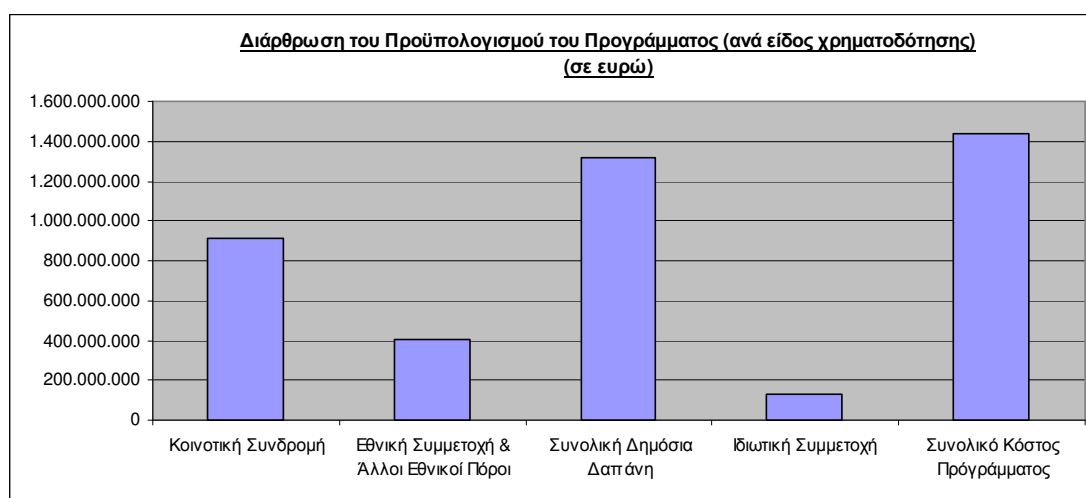

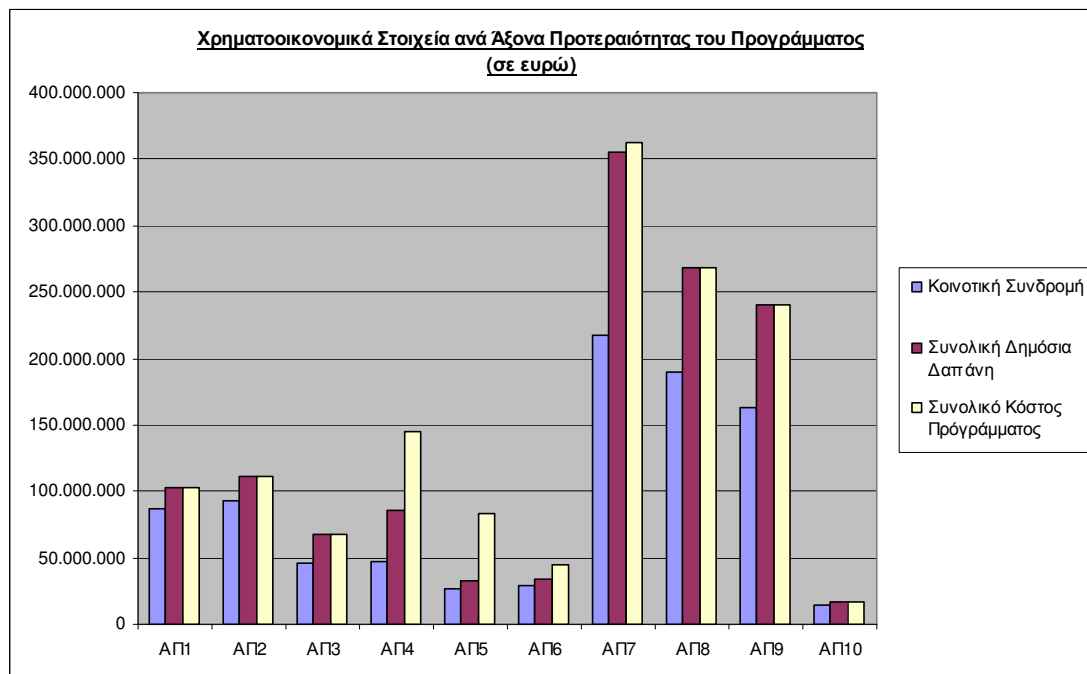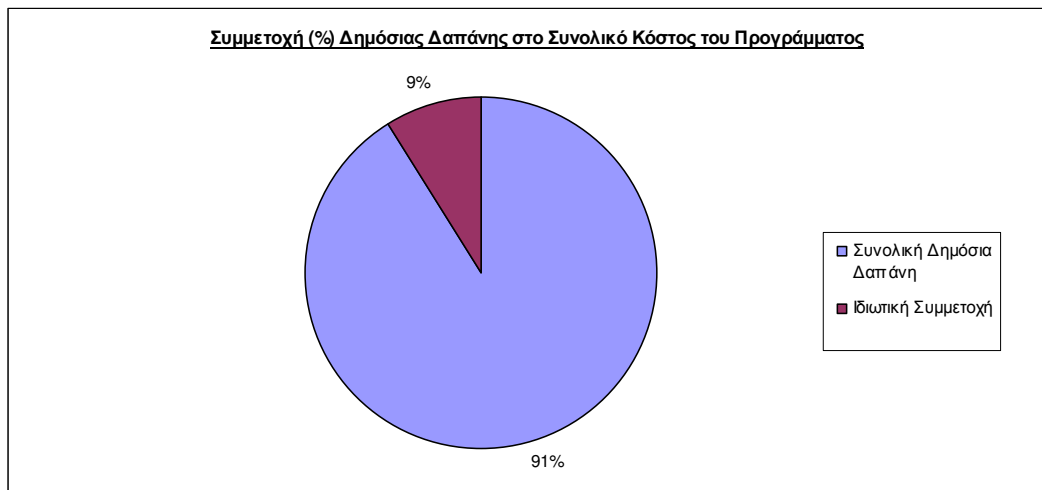

Σημειώνεται ότι, το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δύναται να χρηματοδοτήσει, κατά συμπληρωματικό τρόπο και εντός ορίου 10% της κοινοτικής συνδρομής κάθε Άξονα Προτεραιότητάς του ("ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο συνδρομής του ΕΚΤ (ήτοι δράσεις ή παρεμβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης μιας πράξης και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8 και 9 προβλέπεται να γίνει χρήση της "ρήτρας ευελιξίας" για τη χρηματοδότηση κατηγοριών παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ, οι οποίες θα συμβάλουν κατά τρόπο συμπληρωματικό

στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεμβάσεων των εν λόγω Αξόνων Προτεραιότητας.

Ο Πίνακας που ακολουθεί σχετικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία εφαρμογής του Ε.Π., περιλαμβάνει μόνο τις πληρωμές που ελήφθησαν από την Επιτροπή ως προκαταβολή σωρευτικά για τα έτη 2007 και 2008, ενώ δαπάνες από την υλοποίηση του ΠΕΠ δεν έχουν δηλωθεί μέχρι 31/12/2008..

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ"					
Άξονας προτεραιότητας ανά πηγή χρηματοδότησης (σε ευρώ)					
Άξονας προτεραιότητας	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη Διαχειριστική Αρχή	Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά	Ιδιωτικές δαπάνες	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή των πληρωμών στους δικαιούχους	Σύνολο των πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή 2008
ΑΠ 1	Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας – Αμιγής Στόχος 'ΣΥΓΚΛΙΣΗ' (ΕΤΠΑ)				2.613.000
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				0
ΑΠ 2	Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου – Αμιγής Στόχος 'ΣΥΓΚΛΙΣΗ' (ΕΤΠΑ)				2.790.000
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				0
ΑΠ 3	Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων- Αμιγής Στόχος 'ΣΥΓΚΛΙΣΗ' (ΕΤΠΑ)				1.381.500

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ"					
Άξονας προτεραιότητας ανά πηγή χρηματοδότησης (σε ευρώ)					
Άξονας προτεραιότητας	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη Διαχειριστική Αρχή	Αντιστοιχη δημόσια συνεισφορά	Ιδιωτικές δαπάνες	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή των πληρωμών στους δικαιούχους	Σύνολο των πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή 2008
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				0
ΑΠ 4	Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας – Αμιγής Στόχος 'ΣΥΓΚΛΙΣΗ' (ΕΤΠΑ)				1.405.500
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				0
ΑΠ 5	Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου – Αμιγής Στόχος 'ΣΥΓΚΛΙΣΗ' (ΕΤΠΑ)				780.000
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				0
ΑΠ 6	Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων – Αμιγής Στόχος 'ΣΥΓΚΛΙΣΗ' (ΕΤΠΑ)				876.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ"					
Άξονας προτεραιότητας ανά πηγή χρηματοδότησης (σε ευρώ)					
Άξονας προτεραιότητας	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη Διαχειριστική Αρχή	Αντιστοιχη δημόσια συνεισφορά	Ιδιωτικές δαπάνες	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή των πληρωμών στους δικαιούχους	Σύνολο των πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή 2008
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				0
ΑΠ 7	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας – Αμιγής Στόχος 'ΣΥΓΚΛΙΣΗ' (ΕΤΠΑ)				6.536.100
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				0
ΑΠ 8	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου – Αμιγής Στόχος 'ΣΥΓΚΛΙΣΗ' (ΕΤΠΑ)				5.700.000
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				0
ΑΠ 9	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων– Αμιγής Στόχος 'ΣΥΓΚΛΙΣΗ' (ΕΤΠΑ)				4.903.500

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ"					
Άξονας προτεραιότητας ανά πηγή χρηματοδότησης (σε ευρώ)					
Άξονας προτεραιότητας	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη Διαχειριστική Αρχή	Αντιστοιχη δημόσια συνεισφορά	Ιδιωτικές δαπάνες	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή των πληρωμών στους δικαιούχους	Σύνολο των πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή 2008
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				0
ΑΠ 10	Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής- Αμιγής Στόχος 'ΣΥΓΚΛΙΣΗ' (ΕΤΠΑ)				434.400
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ				0
Γενικό σύνολο					27.420.000
Δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ επί του γενικού συνόλου					0

* Το σύνολο των Προκαταβολών αφορά τις προκαταβολές που ελήφθησαν από την Επιτροπή την 15/05/2008, για το έτος 2008

1.1.3 Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των ταμείων

Ο παρακάτω πίνακας, ο οποίος παρουσιάζει μία σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία δεν θα συμπληρωθεί αλλά θα υποβληθεί όμοιος πίνακας excel με στοιχεία προϋπολογισμού ένταξης, ο οποίος θα σταλεί ως διακριτό αρχείο από το κυρίως κείμενο της έκθεσης, όπως άλλωστε έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πίνακας παρουσιάζεται στο Παράρτημα του Παρόντος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία

Συνδυασμός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5					
Κωδικός * Διάσταση 1 Θέμα προτεραιότητας	Κωδικός * Διάσταση 2 Μορφή χρηματοδότησης	Κωδικός * Διάσταση 3 Έδαφος	Κωδικός * Διάσταση 4 Οικονομική δραστηριότητα	Κωδικός * Διάσταση 5 Γεωγραφική περιοχή	Ποσό **
Σύνολο					

* Οι κατηγορίες θα πρέπει να είναι κωδικοποιημένες για κάθε διάσταση σύμφωνα με την τυποποιημένη ταξινόμηση.

** Χορηγούμενο ποσό της κοινοτικής συνδρομής για κάθε συνδυασμό κατηγοριών.

1.1.4 Συνδρομή ανά ομάδα – στόχο

Λόγω του ότι κατά, το έτος αναφοράς δεν υπήρχε σημαντική εξέλιξη στην φυσική πρόοδο, δεν μπορεί να γίνει αναφορά σε ομάδες στόχους.

1.1.5 Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής

Ομοίως λόγω μη εμφάνισης δαπανών στο Πρόγραμμα κατά το έτος αναφοράς δεν υφίστανται θέματα ανάκτησης της συνδρομής.

1.1.6 Ποιοτική ανάλυση

Λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη εμφάνιση στοιχείων υλοποίησης κατά το έτος αναφοράς, δεν είναι δυνατή η ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Προγράμματος.

Σε , ότι αφορά τη συνδρομή του Προγράμματος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας και την συνάφειά του με τα επί μέρους σχετικά έγγραφα και πολιτικές, όπως ΕΠΜ, ΕΣΠΑ 2007-2013, Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότητας (ΣΚΓΚ) και Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές (ΟΚΓ), υπάρχει σχετική αναφορά, στο Κεφάλαιο 2 της παρούσας.

Τέλος, ως προς τις συνέπειες του Προγράμματος στην προώθηση των ίσων ευκαιριών,, γίνεται αναφορά στο Κεφάλαιο 4.1.

1.2 Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο

Όπως είναι αναμενόμενο, λόγω του ότι το έτος αναφοράς 2008, ήταν έτος ολοκλήρωσης της προετοιμασίας εξειδίκευσης και ενεργοποίησης του Προγράμματος, δεν εντοπίστηκαν προβλήματα ως προς τη συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο. Εντούτοις στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της προετοιμασίας και του σχεδιασμού των μηχανισμών εφαρμογής (διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου) του Προγράμματος, κυρίαρχη κατεύθυνση ήταν η διασφάλιση της συμμόρφωσης των πράξεων και διαδικασιών εφαρμογής του Προγράμματος με το κοινοτικό δίκαιο.

1.3 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, λόγω περιορισμένης προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

1.3.1 Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το γεγονός που σημάδεψε το έτος 2008 είναι αναμφίβολα η κρίση, που αρχικά μεν ξέσπασε στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ στη συνέχεια μετεξελίχθηκε στην χειρότερη οικονομική κρίση της μεταπολεμικής εποχής για την παγκόσμια οικονομία, επηρεάζοντας αρνητικά όλες τις οικονομικές δραστηριότητες και δημιουργώντας πολύ σοβαρά κοινωνικά προβλήματα.

Τα δημόσια οικονομικά χειροτέρευσαν σε όλες τις χώρες. Το έλλειμμα έφτασε το 2 % του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη το 2008 και αναμένεται να εκτιναχθεί πλέον του 5 % του ΑΕΠ το 2009. Οι ρυθμοί ανάπτυξης υποχωρούν σε όλο τον κόσμο και στο

πλαίσιο της Ευρωζώνης έχουν γίνει αρνητικοί με εξαίρεση την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η εξέλιξη της πορείας των οικονομιών της ευρωζώνης είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Το συμπέρασμα στο τελευταίο Ecofin είναι, ότι η ύφεση στην ευρωζώνη θα είναι μεγαλύτερης έντασης απ' ό,τι είχε εκτιμηθεί μόλις πριν από μερικούς μήνες. Μέχρι το 2010 αναμένεται να προστεθούν 8 εκατ. επιπλέον άνεργοι. Ο φόβος για κοινωνικές εκρήξεις απλώνεται σε όλη την Ευρώπη.

Μέσα σε αυτή τη διεθνή κρίση η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Τα δεδομένα δεν είναι πλέον τα ίδια με όσα επικρατούσαν και προϋπολογίζονταν το φθινόπωρο του 2008.

- Ο ρυθμός ανάπτυξης μειώνεται σημαντικά. Από την αρχική εκτίμηση για ρυθμό της τάξεως του 2,8 – 3,0% για το 2009, σήμερα υπολογίζεται γύρω στο 0,5 %.
- Τα δημόσια έσοδα εμφανίζεται να περιορίζονται έναντι των αρχικών εκτιμήσεων και προβλέψεων του προϋπολογισμού.
- Η ανεργία, που σταδιακά και σταθερά μειωνόταν τα τελευταία 5 χρόνια, εμφανίζει και πάλι αυξητικές τάσεις και ρυθμούς.

Οι ανάγκες για στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων αυξάνονται. Ειδικά προγράμματα για την αντιμετώπιση της κρίσης, τέθηκαν σε εφαρμογή στις περισσότερες χώρες.

Η ελληνική θέση για την αντιμετώπιση της κρίσης περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων:

- **τη σταδιακή μείωση του ελλείμματος και του χρέους.**
- **τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.**
- **τη στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων.**

Στα ειδικά μέτρα για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων:

- Η παροχή εγγυήσεων για όλες τις καταθέσεις στις τράπεζες καθώς και τα μέτρα για την προστασία των δανειοληπτών.
- Το ειδικό σχέδιο για τις τράπεζες και την ενίσχυση της ρευστότητας, συνολικού ύψους 28 δισεκατομμυρίων ευρώ.

- Η στήριξη, με χαμηλότοκα δάνεια, ύψους 9,5 δισ. ευρώ, 80.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΤΕΜΠΜΕ και η υλοποίηση ειδικού προγράμματος ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.
- Η θεσμοθέτηση της δυνατότητας για δανειοδότηση σε ποσοστό 100% για την αγορά κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης και ο διπλασιασμός του αφορολόγητου για τους τόκους των στεγαστικών δανείων για ανέγερση ή αγορά κατοικίας.
- Η ενίσχυση μέσω του επενδυτικού νόμου πάνω από 6.000 επενδύσεων, συνολικού ύψους 12 δισ. ευρώ που θα δημιουργήσουν πάνω από 28.500 νέες θέσεις απασχόλησης.
- Η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, από τους πόρους του οποίου θα αντληθούν, μέσα στο 2009, δαπάνες περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για να στηρίξουν την ανάπτυξη, την απασχόληση, την παιδεία και το κοινωνικό κράτος.
- Η εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ΣΔΙΤ σε έργα υποδομών της χώρας παράλληλα προς την υλοποίηση ή ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής.
- Η προκήρυξη, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, προγραμμάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων που κτίστηκαν πριν το 1980, αφενός μεν δίνοντας ώθηση τόσο στη βιομηχανία δομικών υλικών, όσο και σε συναφή με τον κλάδο των κατασκευών επαγγέλματα, αφετέρου και παράλληλα δε ενισχύοντας το εισόδημα των νοικοκυριών με τη μείωση των δαπανών τους για ενέργεια.
- Η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς η Ελλάδα είναι μια από τις 4 χώρες της Ε.Ε. που βρίσκονται μέσα στους στόχους του πρωτοκόλλου του Κιότο.
- Η δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με αποτέλεσμα να τριπλασιαστεί η εγκατεστημένη ισχύς.
- Η λήψη και εφαρμογή εξειδικευμένων δράσεων και μέτρων για τη στήριξη συγκεκριμένων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας όπως εκείνοι των τουριστικών επιχειρήσεων, της οικοδομής, των εξαγωγών και του αυτοκινήτου.

Για τη στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων αποφασίσθηκε μεταξύ των άλλων:

- Η διασφάλιση πόρων 22 δισ. ευρώ ως το 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης με παράλληλη ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος με επιπλέον 500 εκ. ευρώ.

- Η δημιουργία περισσότερων από 1.800 ολόημερων νηπιαγωγείων και δημοτικών για τη στήριξη της εργαζόμενης οικογένειας αλλά και 55 νέων ειδικών σχολείων για ΑμεΑ σε όλη τη χώρα.
- Η αύξηση κατά 63% των δαπανών για το κοινωνικό κράτος, σε σύγκριση με το 2004.
- Η διάθεση 450 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων, μέσω του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής.
- Η αύξηση του επιδόματος ανεργίας από 299 ευρώ στα 431 ευρώ.

1.3.2 Ουσιαστική τροποποίηση βάσει του άρθρου 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Με δεδομένη την περιορισμένη πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος κατά το 2008, είναι προφανές ότι δεν υπήρξαν περιπτώσεις, στις οποίες εντοπίστηκε σημαντική τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

1.4 Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα

Από το σχεδιασμό του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά» έχουν προβλεφθεί διαδικασίες / ρυθμίσεις για την εξασφάλιση συμπληρωματικότητας και συντονισμού των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, καθώς και για την εξασφάλιση της οριοθέτησης «διαχωρισμού», μεταξύ των παρεμβάσεων των Ε.Π με αυτές που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, το ΕΤΑ και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 9, παραγρ. 4 του Κ (ΕΚ) 1083/2006. Συγκεκριμένα και όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο σημείο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο κύριος όγκος των παρεμβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της προσπελασιμότητας των αγροτικών περιοχών και τις παρεμβάσεις σε υποδομές περιβάλλοντος, θα καλυφθεί από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η ενίσχυση μεγάλης κλίμακας επενδυτικών σχεδίων, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η αναβάθμιση του συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, η προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα καλυφθούν από το ΕΤΠΑ, ενώ η αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και οι παρεμβάσεις στους ανθρώπινους πόρους, θα καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού έχουν θεσπισθεί συγκεκριμένα κριτήρια διαχωρισμού των παρεμβάσεων σε σχέση με τα μέσα χρηματοδότησης κάθε παρέμβασης. Η θέσπιση δε των κριτηρίων διαχωρισμού μεταξύ των ομοειδών κατηγοριών πράξεων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από τα διαφορετικά Ταμεία δεν διαπνέεται από «διαχειριστική» λογική, αλλά αντανακλά τις προτεραιότητες των επιμέρους πολιτικών (περιφερειακή πολιτική, πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, αλιευτική πολιτική), το σύνολο των οποίων επηρεάζεται από τη διάσταση του χώρου.

Θα πρέπει δε να ληφθεί υπόψη ότι η μεγάλη έκταση των αγροτικών περιοχών, το μήκος της ακτογραμμής και το πλήθος των νησιών καθιστούν απαγορευτική την υιοθέτηση ως μόνου κριτηρίου διαχωρισμού των πράξεων των Ταμείων το «χωρικό – γεωγραφικό» κριτήριο, διότι είναι δεδομένο ότι οι πόροι του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ δεν επαρκούν για να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες στις δυο γενικές ομάδες παρεμβάσεων, μέσω των οποίων θα εξυπηρετηθούν ο στόχος της διαφοροποίησης της οικονομίας των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία, καθώς και ο στόχος της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές. Αυτές οι δύο γενικές ομάδες παρεμβάσεων αφορούν στις παρεμβάσεις επί του παραγωγικού περιβάλλοντος και στις παρεμβάσεις για έργα υποδομών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.

Παράλληλα, όμως, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα θέσπισης κριτηρίων, η οποία εντοπίστηκε, στους ακόλουθους τομείς παρεμβάσεων:

- Δράσεις κατάρτισης – Ανθρώπινο δυναμικό
- Παρεμβάσεις στον τομέα του Περιβάλλοντος.
- Παρεμβάσεις με βάση την προσέγγιση LEADER που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ
- Παρεμβάσεις για την ανάπτυξη επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών μέσω μιας τοπικής στρατηγικής, που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΑ.

Ως εκ τούτου και με βάση την παραπάνω προσέγγιση, τα κριτήρια διαχωρισμού των πράξεων που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αποτελούν ένα συγκερασμό χωρικών – γεωγραφικών, οικονομικών και διοικητικών κριτηρίων.

Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον επτά (7) ετών, τα κριτήρια διαχωρισμού μπορούν να συμπληρωθούν ή/και να αναθεωρηθούν, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

1.5 Ρυθμίσεις παρακολούθησης

1.5.1 Κανονιστικά θέματα

Με την απόφαση με αρ.12425 στις 22/12/08, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των δεκατριών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση».

Το ΣΔΕ σχεδιάστηκε με βασικούς στόχους την ικανοποίηση των απαιτήσεων που επιβάλλονται από τους Κανονισμούς 1083/2006 και 1828/2006, την αξιοποίηση της εμπειρίας από τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ και την εισαγωγή παραμέτρων που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των διοικητικών λειτουργιών και στην επιτάχυνση των διαδικασιών, στην πρόληψη αστοχιών, στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον περιορισμό του διαχειριστικού κόστους.

Το ΣΔΕ είναι κοινό για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» δεδομένου ότι τα βασικά στοιχεία του Συστήματος είναι κοινά. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο θέτει τους όρους για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των δημόσιων πόρων Περιλαμβάνει τον ορισμό της Διαχειριστικής Αρχής και των επί μέρους Αρχών που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και τον ορισμό της Αρχής Πιστοποίησης και της Αρχής Ελέγχου, που είναι κοινές για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Επίσης περιλαμβάνει ένα σύνολο στοιχείων που απαιτούνται από τον Εφαρμοστικό Κανονισμό όπως την αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζουν η Διαχειριστική Αρχή, οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, η Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου και τα έντυπα που χρησιμοποιούν, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους, τους κανόνες επιλεξιμότητας, τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για παρατυπίες και ανακτήσεις, τους κανόνες τήρησης του Κοινοτικού Δικαίου.

Το ΣΔΕ θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «*Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013*», στον οποίο προσδιορίζονται οι φορείς που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου, οι κανονιστικές αποφάσεις με τις οποίες εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες και η οργανωτική δομή των εμπλεκόμενων αρχών, καθώς και μία σειρά μέτρων που

στόχο έχουν τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης κατά την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Η διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» ασκείται από την Ειδικές Υπηρεσίες των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων.

1.5.2 1^η Επιτροπή Παρακολούθησης

Η 1^η Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. «**Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων**» συγκροτήθηκε με την αριθ. «**5257/ΕΥΣ630/5-2-2008**» Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στην οποία καθορίζεται η αποστολή και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α'/3.12.2007). Η 1^η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων πραγματοποιήθηκε την 6η Μαρτίου 2008 στην Κέρκυρα.

Η ημερήσια διάταξη της 1^{ης} Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων περιελάμβανε:

- Την παρουσίαση του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013
- Τα νέα δεδομένα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
- Την ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης
- Την ψήφιση των κριτηρίων επιλογής πράξεων
- Την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων
- Την συνοπτική παρουσίαση της μεθοδολογίας για την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
- Το Σχέδιο Αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης

1.5.3 Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος.

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, η **παρακολούθηση (monitoring)** αποτελεί μια βασική παράμετρο αφού παρέχει τη δυνατότητα τα αποτελέσματα της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων να συγκρίνονται με τις πραγματικά προκαλούμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι βασικές αρχές της παρακολούθησης της ΣΠΕ καθώς και η σύνδεσή της με την αξιολόγηση των Ε.Π. τέθηκαν στη σχετική Εγκύκλιο, που καταρτίστηκε από την Εθνική Αρχή

Συντονισμού (ΕΥΣΣΑΑΠ) (Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, Α.Π.: 26673/ΕΥΣΣΑΑΠ 1485, 10.6.2008).

Τα βασικά εργαλεία για την «περιβαλλοντική παρακολούθηση» των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 4^{ης} προγραμματικής περιόδου είναι:

- i. Η εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
- ii. Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων
- iii. Η εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων και
- iv. Τα στοιχεία παρακολούθησης της υλοποίησης των ΕΠ συμπεριλαμβανομένων σχετικών δεικτών υλοποίησης.

Η παρακολούθηση θα διεξάγεται μέσω **ετήσιων και συγκριτικών εκθέσεων**, όπως ορίζεται στις ΚΥΑ έγκρισης των ΣΜΠΕ των ΕΠ. Οι **ετήσιες εκθέσεις** περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα αφορούν τα πεπραγμένα κάθε έτους και θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται εντός του επομένου έτους **έως και 30 Απριλίου**. Οι εκθέσεις αυτές θα υποβάλλονται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΥΠΟΙΟ, καθώς και στην αρμόδια ειδική υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, που θα συντονίζει και θα παρακολουθεί το σύνολο των περιβαλλοντικών έργων ενώ παράλληλα θα τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Η **πρώτη ετήσια έκθεση** παρακολούθησης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης θα αφορά το έτος 2008 περιλαμβάνοντας και τα πεπραγμένα του 2007 και **κατ' εξαίρεση θα υποβληθεί μέχρι 30^η Σεπτεμβρίου 2009** αφού οριστικοποιηθούν οι προδιαγραφές κατάρτισης των ετήσιων εκθέσεων.

Η περιβαλλοντική παρακολούθηση των ΕΠ αποτελεί ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής με τη συνδρομή και συνεργασία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, που ενδεχομένως συμμετέχουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Για τον καλύτερο συντονισμό της περιβαλλοντικής παρακολούθησης ανατέθηκε το 2009 από την ΕΑΣ (ΕΥΣΣΑΑΠ) σε εμπειρογνώμονα το έργο της υποστήριξης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού σε σχέση με την παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Τέλος, εντός του 2009 συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας στο πλαίσιο της ΕΑΣ με στόχο την εφαρμογή της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης κατά την

υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ μέσω σχετικών εισηγήσεων, προτάσεων και γνωμοδοτήσεων στα σχετικά θέματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ

Στο πλαίσιο της περιόδου αναφοράς της παρούσας έκθεσης, οι ενέργειες *“ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας”* που εντάχθηκαν στο πλαίσιο του *“Άξονα προτεραιότητας 9 “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων”* του ΠΕΠ, συνέβαλαν με 6.399.661 ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής (σε όρους Π/Υ ένταξης) στην εφαρμογή του Γενικού Στόχου 9 του ΕΣΠΑ (*Πρώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης*) και του Ειδικού Στόχου του που αφορά σε *“Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη ατόμων που χρήζουν βοήθειας”*.

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις αυτές θα συνεισφέρουν με 6.399.661 ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής για το Στόχο 1-Σύγκλιση, στην επίτευξη του εθνικού χρηματοδοτικού στόχου που έχει τεθεί στο ΕΣΠΑ για την ατζέντα της Λισσαβώνας (Earmarking).

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς της παρούσας έκθεσης προόδου υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2008-2010, με τις εξής προτεραιότητες:

- Συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών.
- Ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας, κυρίως μέσω μεταρρυθμίσεων αλλά και από την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων στη Δημόσια Διοίκηση, στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την πρόωση της Κοινωνίας της Γνώσης.
- Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυση του ανταγωνισμού, άνοιγμα των αγορών, αύξηση της εξωστρέφειας αλλά και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

- Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στην απασχόληση, μείωση της ανεργίας, καθώς και αποτελεσματικότερη λειτουργία των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επανακατάρτισης.

Οι στρατηγικές επιδιώξεις που αφορούν στη συμβολή του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων του στο ΕΠΜ αναπτύσσονται σε τέσσερα επίπεδα:

- Α) Αύξηση της χρηματοδοτικής προσπάθειας που καταβάλλεται σε εθνικό επίπεδο μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων και του ΕΣΠΑ για την εξυπηρέτηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, συγκριτικά με το Γ ΚΠΣ.
- Β) Μεγιστοποίηση της συνεισφοράς του ΕΣΠΑ και των ΕΠ στο επίπεδο των ποσοτικών στόχων ή/και δεικτών της Λισσαβόνας, έτσι ώστε να βελτιωθεί η σχετική θέση της χώρας σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ (όπως παρακολουθείται περιοδικά με τους διαρθρωτικούς δείκτες), τόσο σε ονομαστικούς όσο και σε πραγματικούς όρους.
- Γ) Συμβολή στην επίτευξη των ποιοτικών στόχων του ΕΠΜ, διασφάλιση της συνέπειας των Επ. Προγραμμάτων με τις 24 Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές και ανταπόκριση στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ελλάδα.
- Δ) Συντονισμός ΕΣΠΑ και ΕΠΜ στα επίπεδα του σχεδιασμού, εφαρμογής, διαχείρισης, στρατηγικής παρακολούθησης και αξιολόγησης. Ολοκλήρωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ και το Νόμο 3614/2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται, ανά άξονα προτεραιότητας, τα στοιχεία υλοποίησης του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων, με βάση όσα αποτυπώθηκαν ήδη στην παράγραφο 1.1. ως προς την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος κατά το έτος αναφοράς της παρούσας Έκθεσης (2008). Σημειώνεται, ότι όσον αφορά τις τιμές αφετηρίας και στόχους στους πίνακες δεικτών οι οποίοι ακολουθούν, τα στοιχεία και οι σχετικές αναφορές έχουν αντληθεί από το ΕΠ, στο οποίο υπάρχει αναλυτική παρουσίαση

3.1 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας»

3.1.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας εξυπηρετεί τη στρατηγική επιδίωξη και τον βασικό αναπτυξιακό στόχο του Προγράμματος που είναι η ανάπτυξη και οργάνωση των υποδομών και υπηρεσιών προσπελασιμότητας, με την ταχύτερη ολοκλήρωση της ανάπτυξης του συστήματος μεταφορών για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ασφαλούς μετακίνησης.

Οι γενικοί στόχοι του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας αφορούν στην αναβάθμιση και συμπλήρωση των δικτύων μεταφορών και των μεταφορικών υπηρεσιών, στη μείωση του χρόνου και του κόστους μεταφοράς προσώπων και αγαθών και στη βελτίωση της ασφάλειας και του επιπέδου εξυπηρέτησης.

Οι γενικοί στόχοι εξειδικεύονται σε επιμέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, κατά το έτος αναφοράς 2008 της παρούσας έκθεσης (2008), εξειδικεύθηκαν οι Θεματικές Προτεραιότητες:

- 22 «Εθνικές Οδοί» και
- 23 «Περιφερειακές/ τοπικές οδοί».

Στη συνέχεια και μετά την εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης της Θεματικής Προτεραιότητας 23 «Περιφερειακές/ τοπικές οδοί» και την έγκρισή τους με τη γραπτή διαδικασία από την Επιτροπή Παρακολούθησης δημοσιεύθηκε η πρώτη πρόσκληση με κωδικό Πρόσκλησης 01/23/01/14672 27.10.2008. Η εν λόγω πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 32.941.177,00 €.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προγραμματικά στοιχεία και οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

Όμως, δεν είναι δυνατή η ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων του Άξονα, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν συνεπειών στην ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς αφενός μεν η φυσική πρόοδος του Άξονα

αφορά μόνον τις παραπάνω εξειδικεύσεις και τη σχετική με τη μία εξ αυτών προκήρυξη αφετέρου δε δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος στην εφαρμογή του Άξονα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Βελτίωση – κατασκευή εθνικής οδοποιίας (Χλμ.)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										6,5
	Αφετηρία	895									
Βελτίωση – κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας (Επαρχ. Δίκτυο) (Χλμ.)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										143
	Αφετηρία	3520									
Βελτίωση σιδηροδρομικού δικτύου (Χλμ.)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										6,7
	Αφετηρία	268,966									
Ποσοστό οδικού δικτύου που αναβαθμίζεται επί του συνολικού υφιστάμενου (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										3,4%
	Αφετηρία										

- Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.1.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, και επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.2 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου»

3.2.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Στόχος του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας είναι η λειτουργική και χωρική διασύνδεση των περιοχών της ενδοχώρας μεταξύ τους, αλλά και με τα αστικά και ημιαστικά εμπορικά και τουριστικά κέντρα της Περιφέρειας και κατ' επέκταση, μέσω του συστήματος των αυτοκινητόδρομων και λιμένων, και σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες υποδομές που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, με τα παραγωγικά / οικονομικά και διοικητικά κέντρα της Χώρας και του ευρύτερου διεθνούς χώρου.

Ο γενικός στόχος εξυπηρετείται / επιτυγχάνεται με την επίτευξη επιμέρους ειδικών στόχων, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, κατά το έτος αναφοράς 2008, εξειδικεύτηκαν οι παρακάτω κωδικοί θεματικής προτεραιότητας:

- Θεματική Προτεραιότητα 22 «Εθνικές Οδοί»
- Θεματική Προτεραιότητα 23 «Περιφερειακές/ Τοπικές Οδοί»

Με την από 6/03/2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 02: Υποδομές Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προγραμματικά στοιχεία και οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Βελτίωση - κατασκευή εθνικής οδοποιίας (χλμ.)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										35
	Αφετηρία	1.250									
Βελτίωση - κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας (χλμ.)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										45
	Αφετηρία	4.600									
Λιμένες που αναβαθμίζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										3
	Αφετηρία	11									
Αποτελέσματα											
Παρεμβάσεις βελτίωσης / αναβάθμισης - κατασκευής οδικού δικτύου επί του υφιστάμενου (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1,37
	Αφετηρία	2,4									
Παρεμβάσεις αναβάθμισης λιμένων επί των υφιστάμενων (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										27,3
	Αφετηρία	36,0									

• Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.2.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, και επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.3 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων»

3.3.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Στόχο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας αποτελεί η δημιουργία και λειτουργία ενός ασφαλούς, γρήγορου και άνετου ενδοπεριφερειακού μεταφορικού άξονα, με συνδυασμό των συστημάτων μεταφοράς, που θα ενισχύει την «εξωτερική» και «εσωτερική» προσπελασιμότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εντάσσοντας τις βασικές υποδομές μεταφορών, σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Ο άξονας αυτός θα πρέπει να συνδέεται και να λειτουργεί στο πλαίσιο των δικτύων μεταφορών τόσο της ευρύτερης περιοχής με τις απέναντι ελληνικές ηπειρωτικές περιοχές όσο και γενικότερα του θαλάσσιου άξονα Αδριατικής – Ιονίου.

Ο γενικός στόχος εξειδικεύεται σε επιμέρους ειδικούς στόχους, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, κατά το έτος αναφοράς 2008, εξειδικεύθηκαν οι Θεματικές Προτεραιότητες:

- 22 «Εθνικές Οδοί» (6.562.000 ευρώ)
- 23 «Περιφερειακές/ τοπικές οδοί» (40.000.000 ευρώ)

Στη συνέχεια, στις 18/07/2008 εκδόθηκε από την ΕΔΑ Ιονίων Νήσων η πρώτη Πρόσκληση, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 20.000.000€, που αφορά στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 23.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προγραμματικά στοιχεία και οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Βελτίωση-κατασκευή εθνικής οδοποιίας (Χλμ.)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										6,0
	Αφετηρία	90,5									
Βελτίωση-κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητοδρόμων και εθνικής οδοποιίας (Χλμ.)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										57,0
	Αφετηρία	1.390,7									
Λιμένες που αναβαθμίζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										3
	Αφετηρία	15									
Αποτελέσματα											
Αναβάθμιση επί υφισταμένου βασικού οδικού δικτύου (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										4,2
	Αφετηρία	4,3									

- Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.3.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, και επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.4 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας»

3.4.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Στρατηγικός στόχος στο επίπεδο περιφερειακού σχεδιασμού είναι να καταστεί η Περιφέρεια ένας πόλος ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι βασικοί στόχοι του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι εξυπηρετούν το στρατηγικό στόχο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αφορούν στην ίδρυση νέων και στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων όλων των τομέων της οικονομίας, με προτεραιότητα στη νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα, στην ενίσχυση της παραγωγής εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογίας, στη σύνδεση επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, στην ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας και στην ανάδειξη των δυναμικών κλάδων.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, κατά το έτος αναφοράς 2008, εξειδικεύθηκε η Θεματική Προτεραιότητα 02 «Υποδομή Έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (συμπεριλαμβάνοντας υλικό εξοπλισμό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών) και κέντρα αναγνωρισμένου κύρους σε εξειδικευμένη τεχνολογία».

Στη συνέχεια στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προγραμματικά στοιχεία και οι δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Αριθμός επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν από τα προγράμματα	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										166
	Αφετηρία	41.620									
Αριθμός νέων τουριστικών κλινών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										240
	Αφετηρία										
Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										450
	Αφετηρία	15.020									
Αριθμός επιχειρήσεων που ωφελούνται από δράσεις Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										30
	Αφετηρία	26									
Αποτελέσματα											
Ποσοστό αύξησης των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν από τα προγράμματα (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										0,40%
	Αφετηρία										
Ποσοστό αύξησης των τουριστικών κλινών (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										3%
	Αφετηρία										
Ποσοστό τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται ως προς το σύνολο των υφιστάμενων (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										3%
	Αφετηρία	15.020									
Ποσοστό αύξησης των επιχειρήσεων που ωφελούνται από δράσεις Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										115%
	Αφετηρία										

• Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.4.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, και επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.5 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 5: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου»

3.5.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας έχει ως γενικό στόχο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής και διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

Η ανάπτυξη της Περιφέρειας, σχετικά με την ψηφιακή σύγκλιση και την επιχειρηματικότητα, αποτυπώνεται μέσω επιμέρους ειδικών στόχων, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

Κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης (2008), δεν εμφανίζεται φυσική πρόοδος στην εφαρμογή του άξονα. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από το Πρόγραμμα (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										260
	Αφετηρία	33.296									
Αποτελέσματα											
ΜΜΕ που ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										0,81
	Αφετηρία	1,4									

- Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.5.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, και επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.6 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 6: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων»

3.6.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Γενικός στόχος του περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού μέσω του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας και σημαντική μεσοπρόθεσμη προτεραιότητα αποτελούν:

- αφενός η προσπάθεια ιδιαίτερα του εμπλουτισμού του συνολικού τουριστικού προϊόντος, με νέες και εναλλακτικές δυνατότητες προσαρμοσμένες στην τοπική ταυτότητα και ιδιαιτερότητα, που μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη ευελιξία, διαφοροποίηση και αναγνωρισιμότητα,
- αφετέρου δε και συμπληρωματικά, η συνέχιση της προσπάθειας ποιοτικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου παραγωγικού δυναμικού.

Ο γενικός αυτός στόχος θα πραγματοποιηθεί με την επίτευξη επιμέρους ειδικών στόχων, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

Κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης (2008), δεν εμφανίζεται φυσική πρόοδος στην εφαρμογή του άξονα. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013**ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ****ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ**

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Επιχειρήσεις που ενισχύονται από επιδοτούμενα προγράμματα (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										290
	Αφετηρία	16.392									
Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										12.600
	Αφετηρία	190.500									
Αποτελέσματα											
% υφιστάμενων ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται - βελτιώνονται	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1,7%
	Αφετηρία										

- Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.6.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, και επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.7 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας»

3.7.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Στο πλαίσιο της ευρύτερης εθνικής και περιφερειακής πολιτικής προώθησης και μακροπρόθεσμης διατήρησης της ανάπτυξης, οι γενικοί στόχοι του Άξονα αφορούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου, στην προώθηση του τουρισμού, στην άρση της απομόνωσης και στη μείωση του κοινωνικού ρατσισμού, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην προώθηση της ισότητας των φύλων.

Οι γενικοί αυτοί στόχοι θα πραγματοποιηθούν με την επίτευξη επιμέρους ειδικών στόχων, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, κατά το έτος αναφοράς 2008, εξειδικεύθηκαν οι Θεματικές Προτεραιότητες:

- 45 «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)»,
- 69 «Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή».
- 75 «Υποδομές Εκπαίδευσης»,
- 76 «Υποδομές Υγείας» και
- 79 «Άλλες κοινωνικές υποδομές».

Μετά δε την εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης της Θεματικής Προτεραιότητας 69 «Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της

γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή» και την έγκριση τους με τη γραπτή διαδικασία από την Επιτροπή Παρακολούθησης δημοσιεύθηκε η πρώτη προκήρυξη την 16/09/2008. Η εν λόγω πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 10.754.203 €.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προγραμματικά στοιχεία και οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Αριθμός σχεδίων ολοκληρωμένης ανάπτυξης	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										10
	Αφετηρία	12									
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										224
	Αφετηρία	1.999									
Αριθμός αιθουσών διδασκαλίας γ' β'βάθμιας εκπαίδευσης	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										45
	Αφετηρία	37									
Αριθμός αιθουσών διδασκαλίας α'β'βάθμιας & β'βάθμιας εκπαίδευσης	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										70
	Αφετηρία	260									
Αριθμός Μνημείων – Αρχαιολογικών Χώρων που αναδεικνύονται	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										35
	Αφετηρία	91									
Αποτελέσματα											
Ποσοστό πληθυσμού που εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ/ΣΜΑ (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										100%
	Αφετηρία	74%									

- Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.7.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, και επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.8 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου»

3.8.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Η νέα στρατηγική κατεύθυνση της Περιφέρειας εστιάζεται στην αξιοποίηση των συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων της για μια ανάπτυξη στηριζόμενη στην αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών της πόρων, με την προστασία του φυσικού της περιβάλλοντος και τη δημιουργία συνθηκών βελτίωσης του επιπέδου ζωής των κατοίκων της και των επισκεπτών της. Στην κατεύθυνση αυτή, οι γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας αναφέρονται στη βελτίωση των συνθηκών προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στη βελτίωση των προϋποθέσεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και στη διαφοροποίηση του αναπτυξιακού προτύπου της Περιφέρειας.

Οι γενικοί αυτοί στόχοι επιτυγχάνονται σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό, σε σχέση με την επίτευξη επιμέρους ειδικών στόχων, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, κατά το έτος αναφοράς 2008, προωθήθηκε η διαδικασία εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ειδικότερα στον Άξονα 8 προωθήθηκε προς την ΕΑΣ η διαδικασία εξειδίκευσης κωδικών προτεραιότητας του άξονα και με τις ανάλογες εγκρίσεις που ακολούθησαν προωθήθηκε η διαδικασία των προσκλήσεων κατά το έτος 2009:

- Θεματική Προτεραιότητα 44 «Διαχείριση οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων»
- Θεματική Προτεραιότητα 46 «Αποχέτευση Ύδατος (λύματα)»
- Θεματική Προτεραιότητα 69 «Δράσεις ανάπτυξης και λειτουργίας υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας»

Μετά δε την εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης της Θεματικής Προτεραιότητας 69 «Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονιστεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτημένων προσώπων» και την έγκριση τους με τη γραπτή διαδικασία από την Επιτροπή Παρακολούθησης δημοσιεύθηκε η πρώτη προκήρυξη την 08/09/2008. Η εν λόγω πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.375.000 €, για το έτος 2008.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Μνημεία / αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										20
	Αφετηρία	88									
Αίθουσες διδασκαλίας που αναβαθμίζονται / κατασκευάζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										240
	Αφετηρία	4.300									
Νοσοκομειακές Κλίνες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										600
	Αφετηρία	1.860									
ΕΕΛ που αναβαθμίζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										4
	Αφετηρία	19									
ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ που δημιουργούνται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										5
	Αφετηρία	2									
Αποτελέσματα											
Μνημεία / αρχαιολογικοί χώροι που αναδεικνύονται (επί των υφιστάμενων) (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										22,7
	Αφετηρία										
Αίθουσες διδασκαλίας που αναβαθμίζονται / κατασκευάζονται (επί των υφιστάμενων) (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										5,6
	Αφετηρία	4,6									
Νοσοκομειακές Κλίνες που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται (επί των υφιστάμενων) (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										32,26
	Αφετηρία	37,7									
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										100%
	Αφετηρία	13%									

• Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.8.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, και επειδή δεν έχει υπάρξει ένταξη πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.9 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 9: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων»

3.9.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Όσον αφορά στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας και στο πλαίσιο του περιφερειακού αναπτυξιακού προγραμματισμού, στόχος είναι, αφενός μεν η ανάδειξη και η συνετή αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με το πλούσιο πολιτισμικό απόθεμα, ώστε να αποτελέσουν την αναγκαία και ικανή βάση για μια διαφοροποιημένη τοπική ανάπτυξη, αφετέρου δε η διασφάλιση υψηλού επιπέδου κοινωνικών υπηρεσιών και περιβαλλοντικής προστασίας, στοιχείων που συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και ευημερίας των κατοίκων της Περιφέρειας όλα αυτά σε συνδυασμό με την δημιουργία των προϋποθέσεων για μια νέα, δυναμική και μη ανταγωνιστική σχέση πόλεων και ενδοχώρας, που να διασφαλίζει την αξιοποίηση του χώρου ως αναπτυξιακού πόρου.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω επιμέρους ειδικών στόχων, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, κατά το έτος αναφοράς 2008, εξειδικεύθηκαν οι Θεματικές Προτεραιότητες:

- 59 «Ανάπτυξη πολιτιστικών δομών» (6.338.406 ευρώ)
- 69 «Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονιστεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτημένων προσώπων» (68.113.160 ευρώ)

Σε συνέχεια δε της εξειδίκευσης των κριτηρίων αξιολόγησης της Θεματικής Προτεραιότητας 69 «Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονιστεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτημένων προσώπων». δημοσιεύθηκε η πρώτη πρόσκληση στις 5/09/2008. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 6.800.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης εντάχθηκε ένα έργο (αριθμός ένταξης: 8530/23-12-08) συνολικού προϋπολογισμού 8.113.160 ευρώ, Στο εν λόγω, έργο έγινε η χρήση της ρήτρας ευελιξίας του Προγράμματος.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Μονάδες α΄θμιας φροντίδας που δημιουργούνται - αναβαθμίζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										10
	Αφετηρία	51									
Νοσοκομειακές κλίνες που δημιουργούνται αναβαθμίζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										130
	Αφετηρία	569									
Μνημεία - Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										15
	Αφετηρία	26									
Νέοι ΕΕΛ (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										4
	Αφετηρία	15									
ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ που δημιουργούνται - επεκτείνονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										2
	Αφετηρία	4									
Ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										8
	Αφετηρία	3									
Αποτελέσματα											
Εξυηρητούμενος πληθυσμός από δομές α΄θμιας φροντίδας (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										13,0
	Αφετηρία	69,0									
Εξυηρητούμενος πληθυσμός από νοσοκομειακές κλίνες που αναβαθμίζονται - δημιουργούνται (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										10,5
	Αφετηρία	71,0									
Εξυηρητούμενος Πληθυσμός από παρεμβάσεις ολοκληρωμένης ανάπτυξης (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										20.000
	Αφετηρία	8.500									
Πληθυσμός (μόνιμος) που εξυηηρετείται από τη διαχείριση υγρών αποβλήτων (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										3,7
	Αφετηρία	38,0									
Πληθυσμός που εξυηηρετείται από αναβαθμισμένα δίκτυα ύδρευσης (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										4,7
	Αφετηρία	9,0									
Πληθυσμός που εξυηηρετείται από ΧΥΤΑ/ΣΜΑ (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										100,0
	Αφετηρία	55,0									

• Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.9.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.10 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 10: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

3.10.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας αφορά στην τεχνική, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη της υλοποίησης των έργων και ενεργειών του Προγράμματος, στην υποστήριξη για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης, καθώς και σε δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης για το Πρόγραμμα.

3.10.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, και επειδή δεν υπάρχει ένταξη πράξεων στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΛΟΙΠΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.1 Ενσωμάτωση της Αρχής της Μη Διάκρισης και των κριτηρίων προσβασιμότητας των Ατόμων Με Αναπηρία (Άρθρο 16/1083/2006)

Με δεδομένο το στάδιο εφαρμογής του Προγράμματος κατά το έτος 2008, το οποίο, όπως έχει αναφερθεί στα προηγούμενα, ήταν έτος κυρίως ολοκλήρωσης της προετοιμασίας εφαρμογής του Προγράμματος, καθώς και σχεδιασμού και προετοιμασίας των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου δεν υφίστανται απολογιστικά στοιχεία παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων που έχουν ληφθεί για την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του Ε.Π.

Παρ' όλα αυτά, τόσο κατά το σχεδιασμό, όσο και κατά την προετοιμασία εφαρμογής ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των δράσεων των Ταμείων και ειδικότερα της πρόσβασης σε αυτά. Ειδικότερα, η δυνατότητα πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρίες αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά τον καθορισμό πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης.

Τα μέτρα που προβλέπονται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του Ε.Π. περιλαμβάνουν:

- (i) Την ισόρροπη κατά το δυνατόν συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών, που είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας, καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.
- (ii) Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος και των ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηματοδότηση.
- (iii) Την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που έχουν ληφθεί σε σχέση με την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του Ε.Π., την αποτελεσματικότητα τους και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της μη διάκρισης.
- (iv) Τη χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες κατά την διαδικασία επιλογής πράξεων για συγχρηματοδότηση.

Με την διεξαγωγή της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων που έλαβε χώρα στις 6/03/2008 στην Κέρκυρα, εγκρίθηκαν μεταξύ άλλων και δύο σχετικά κριτήρια επιλογής πράξεων το Β3 ' Προαγωγή της ισότητας ευκαιριών και μη διάκριση ' και Β4 ' Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία '.

4.2 Τεχνική Βοήθεια

Με δεδομένο ότι, το έτος 2008 ήταν έτος προετοιμασίας και οριστικοποίησης του περιεχομένου και των μηχανισμών εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, χωρίς να πραγματοποιηθεί ένταξη πράξεων σε αυτό, δεν ενεργοποιήθηκαν και οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο του σχετικού Άξονα Προτεραιότητας 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

4.3 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Στο πλαίσιο των Κανονισμών για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και των οδηγιών που αναφέρονται σε αυτούς και μετά από συνεννόηση με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), οι 3 Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων κατάρτισαν και υπέβαλαν από κοινού το Επικοινωνιακό Σχέδιο του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013.

Το Επικοινωνιακό αυτό Σχέδιο μαζί με τα αντίστοιχα όλων των άλλων ΠΕΠ και Τομεακών Προγραμμάτων υποβλήθηκαν από το Υπ.ΟΙ.Ο στην Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. η οποία στη συνέχεια εξέφρασε τις παρατηρήσεις της.

Μετά την προσαρμογή του, το Επικοινωνιακό Σχέδιο του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ εγκρίθηκε από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ε.Ε στις 11 Σεπτεμβρίου 2008.

Αναλυτικότερα από τις τρεις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές του Ε.Π Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων, πραγματοποιήθηκαν οι κατωτέρω ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας:

Δυτική Ελλάδα

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που πραγματοποιήθηκαν στην Δυτική Ελλάδα αναλύονται παρακάτω:

Το έτος 2008 έγινε η προβλεπόμενη ανάρτηση της Ευρωπαϊκής σημαίας παράλληλα δε πραγματοποιήθηκαν τρεις εναρκτήριες εκδηλώσεις, την 27/05/2008 στο Μεσολόγγι, την 02/06/2008 στον Πύργο και την 04/06/2008 στην Πάτρα αναφορικά με την υλοποίηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος 2007-2013 και

τέλος παράχθηκε και διανεμήθηκε σχετικό ενημερωτικό υλικό (αφίσες, φυλλάδια) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή .

Πελοπόννησος

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που πραγματοποιήθηκαν στην Πελοπόννησο αφορούσαν σε:

- εστιασμένες ημερίδες ή/ και διημερίδες, κυρίως σε τοπικούς φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Πράξεων,
- δημοσίευση στο διαδίκτυο όλων των βασικών κειμένων αναφορικά με την περίοδο 2007-2013, (ΣΔΕ, Προσκλήσεις, προσκλήσεις Διαχειριστικής Επάρκειας)
- ευρεία διαβούλευση μέσω του διαδικτύου και προγραμματισμένων ημερίδων,
- θεματικές συναντήσεις με εμπλεκόμενους στο σχεδιασμό φορείς και οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους,
- περιφερειακά συμβούλια μετά την έγκριση του ΕΠ,
- αποστολή δελτίων τύπου και δημοσίευση συνεντεύξεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο,
- έκδοση εγχειριδίων και εντύπων (αναπαραγωγή ΣΔΕ κλπ, διαχειριστική επάρκεια).
- Έκδοση και διανομή υλικού για τη συνεδρίαση της ΕπΠΑ ΔΕΠΙΝ (6-03-2008)

Ιόνια Νησιά

Σε όλη τη διάρκεια του 2008 υλοποιήθηκαν από την ΕΔΑ Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών οι παρακάτω δράσεις προβολής και δημοσιότητας:

- Από τις 9-16 Μαΐου 2008 **αναρτήθηκε η σημαία** της Ευρωπαϊκής Ένωσης έξω από τα γραφεία των Διαχειριστικών αρχών, σύμφωνα με την υποχρέωση εκ του Κανονισμού
- Διοργανώθηκαν **ενημερωτικές ημερίδες** σε όλους τους Νομούς για ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τις διαδικασίες και την πορεία του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ με τη συμμετοχή των Νομ.Αυτ/σεων, της Τοπικής Αυτ/σης, Επιμελητηρίων, φορέων και υπηρεσιακών παραγόντων. (Οι ενημερωτικές ημερίδες πραγματοποιήθηκαν: 28/07/08 – Κεφαλονιά, 30/07/08 – Κέρκυρα, 1/08/09 – Λευκάδα και 08/08/08 - Ζάκυνθο)

- Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων εξέδωσε έναν ενημερωτικό οδηγό που παρουσιάζει συνοπτικά τους στόχους και τους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας –Πελ/σου – Ιονίων Νήσων 2007- 2013, στο σκέλος που αφορά την Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών. Στο συνοπτικό αυτό κείμενο γίνεται περιγραφή των κυριότερων παρεμβάσεων, των διαδικασιών πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων καθώς και των διαδικασιών διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής των Αναπτυξιακών προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Το έντυπο αυτό εστάλη σε όλους τους δυνητικούς –δικαιούχους και διανεμήθηκε στη διάρκεια των ενημερωτικών ημερίδων που προαναφέρθηκαν.
- Έγινε τακτική ενημέρωση μέσω των τοπικών ΜΜΕ όσον αφορά στις διαδικασίες, την εφαρμογή, την πορεία και τις προκηρύξεις του προγράμματος ΔΕΠΙΝ 2007-2013, τόσο με την αποστολή Δελτίων Τύπου όσο και με Συνεντεύξεις τύπου του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στα ηλεκτρονικά Μέσα ενημέρωσης.
- Όλες οι πληροφορίες και οι προσκλήσεις/ προκηρύξεις, κλπ όσον αφορά στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ που αφορούν την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δημοσιεύθηκαν στην τρέχουσα ιστοσελίδα της ΕΔΑ, στο πλαίσιο των κανόνων διαφάνειας και δημοσιότητας καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ANNEX						
Specify Objective (required only in the case of Multi Obj programmes)	Code - Dimension 1 - Priority Theme	Code - Dimension 2 - Form of Finance	Code - Dimension 3 - Territory	Code - Dimension 4 - Economic Activity	Code - Dimension 5 - Location	EU contribution in € - allocated to selected operations
CON	69	1	0.0	20	GR22	6.399.661
